

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES – GOINFRA, NO ESTADO DE GOIÁS**

Ref.: CONCORRENCIA Nº 025/2025 - GOINFRA.

Processo Administrativo nº 202400005040529

A empresa **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A ("CCL")**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.155.735/0001-10, com sede na Alameda do Sapé, quadra 07, lote 34, Estância Vargem Bonita, Senador Canedo/GO, via representação legal, vem, respeitosamente, perante V. Sra., **PRESTAR ESCLARECIMENTO** quanto a análise da qualificação técnica.

JUSTIFICATIVA

Em atendimento à solicitação quanto a utilização do equipamento Escavadeira Hidráulica com Martelo Hidráulico de 1.700 kg, esclarecemos que o referido equipamento foi utilizado nos serviços de escavações de materiais de 3ª categoria, conforme Atestado de Capacidade Técnica Nº 7/2025, referente ao contrato 044/2018-PR-NEJUR, tendo em vista que, é imprescindível sua utilização, mesmo que não tenha sua contemplação na composição de serviço da Goinfra.

O martelo hidráulico, acoplado à escavadeira, é imprescindível para a fragmentação das rochas, permitindo o desmonte eficiente do material e seu carregamento de forma adequada e segura.

Salientamos que as informações referentes à execução desse serviço constam devidamente registradas no diário de obras da época do contrato, o qual segue anexo para conferência. Apresentamos abaixo imagens extraídas do diário de obras.



Imagem 1 – Utilização de escavadeira com martelo hidráulico
Fonte: Diário de obra anexo (dia 01/02/2022)



Imagem 2 – Utilização de escavadeira com martelo hidráulico
Fonte: Diário de obra anexo (dia 11/02/2022)



Imagem 3 – Utilização de escavadeira com martelo hidráulico
Fonte: Arquivo próprio.



Imagem 4 – Utilização de escavadeira com martelo hidráulico
Fonte: Arquivo próprio.



Imagem 5 – Utilização de escavadeira com martelo hidráulico
Fonte: Arquivo próprio.



Imagem 6 – Utilização de escavadeira com martelo hidráulico
Fonte: Arquivo próprio.

Por fim, sugerimos, confirmação das informações junto ao Gestor do Contrato na Diretoria de Obras Rodoviárias, a fim de ratificar a utilização do referido equipamento.

Atenciosamente,

Senador Canedo/GO, 13 de maio de 2025.

CONSTRUTORA CENTRO
LESTE S
A:02155735000110

Nilton Aires do Couto Junior

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S
A:02155735000110
Dados: 2025.05.14 08:53:31 -03'00'

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A ("CCL")

CNPJ/MF nº 02.155.735/0001-10

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



DIÁRIO DE OBRAS

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)

TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTRATO SUPERVISÃO:
EDITAL:

CONTRATADA:

ASS. CONTRATO:

O. SERV.:

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018
EDITAL: 033/2017

CONTRATADA: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

ASS. CONTRATO: 28/06/2018


O. SERV.: 28/06/2018

PROCESSO TÉCNICO DE SUPERVISÃO (SEI):
PROCESSO DE PAGAMENTO DE SUPERVISÃO (SEI):
PROCESSO DE PRODUTOS DE SUPERVISÃO (SEI):

PROCESSO TÉCNICO DE EXECUÇÃO (SEI): 201600036000617
PROCESSO DE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO (SEI): 201800036006196

Pablo Fernandes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA 5061417293

	DIÁRIO DE OBRAS										N.º 1					
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)										FL.: 1					
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)										DATA: 01/02/2022						
DADOS EXECUTORA										DIA DA SEMANA: terça-feira						
EDITAL: 033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018										
BASE PROPOSTA: Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1314		RESTANTE (VIGÊNCIA): 116		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1314 RESTANTE (EXECUÇÃO): -171								
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900										
BASE PROPOSTA: Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44593		RESTANTE (VIGÊNCIA): -32		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44593 RESTANTE (EXECUÇÃO): -216								
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
O CONTRATO COM A SUPERVISORA RTA ACABOU EM 31/12/2021 E NÃO FOI RENOVADO.																
ESTE GESTOR ASSUMIU A OBRA NESTA DATA COM A SAÍDA DO ENG. REGINALDO ANTÔNIO, NA OCASIÃO VERIFICOU-SE PROBLEMAS JÁ RELATADOS POR ELE NO PROCESSO TÉCNICO EM RELAÇÃO																
A EROSIÃO DOS TALUDES CAUSADOS POR DEFICIÊNCIA DOS MATERIAIS EXISTENTES (ARENOSOS). ESTES TALUDES DEVERÃO SER OBJETO DE PROJETO ESPECÍFICO DE CONTENÇÃO E TRATAMENTO																
FORA DO CONTRATO DA CONSTRUTORA																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
PERFURAÇÃO DE ROCHA.																
FRAGMENTAÇÃO DE PEDRA.																
RECONFORMAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETA.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECULAGEM DE BASE	GRUPO	TSD	IMPERMEABILIZAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		X													
CLIMA: ☐ SOL ☒ NUBLADO ☐ CHUVA																
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 56614-7/293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 1
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		DIA DA SEMANA: terça-feira	
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1314	RESTANTE (VIGÊNCIA): 116 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1314 RESTANTE (EXECUÇÃO): -171
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44593	RESTANTE (VIGÊNCIA): -32 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44593 RESTANTE (EXECUÇÃO): -216
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - PERFURAÇÃO DE ROCHA	FOTO 2 - FRAGMENTAÇÃO DE PEDRA	FOTO 3 - RECONFORMAÇÃO PARA SARJETA	
	FOTO 5 -	FOTO 6 -	
FOTO 4 - RECONFORMAÇÃO PARA SARJETA	FOTO 5 -	FOTO 6 -	
 Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 506147293			

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 2
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 02/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018) 0 DIA DA SEMANA: quarta-feira			
DADOS EXECUTORA EDITAL: 033/2017 CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018 ASS. CONTRATO: 28/06/2018 O. SERV.: 28/06/2018 BASE PROPOSTA: Abr./2017 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022 DECORRIDO: 1315 REstante (VIGÊNCIA): 115 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1315 REstante (EXECUÇÃO): -172			
DADOS SUPERVISORA EDITAL: 0 CONTRATO SUPERVISÃO: 0 ASS. CONTRATO: 00/01/1900 O. SERV.: 00/01/1900 BASE PROPOSTA: Mar./2018 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021 DECORRIDO: 44594 REstante (VIGÊNCIA): -33 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44594 REstante (EXECUÇÃO): -217			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CATEGORIA.	FOTO 2 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.	FOTO 3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.	
			
FOTO 4 - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS.	FOTO 5 -		
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CRE 15061417293			



DIÁRIO DE OBRAS

N.º 3

FL.: 1

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)

DATA: 03/02/2022

TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)

DIA DA SEMANA: quinta-feira

DADOS EXECUTORA

EDITAL: 033/2017

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018

ASS. CONTRATO:

28/06/2018

O. SERV.:

28/06/2018

BASE PROPOSTA: Abr./2017

PRazo DE VIGÊNCIA: 28/05/2022

DECORRIDO: 1316

RESTANTE (VIGÊNCIA): 114

PRazo DE EXECUÇÃO: 14/08/2021

DECORRIDO: 1316

RESTANTE (EXECUÇÃO): -173

DADOS SUPERVISORA

EDITAL: 0

CONTRATO SUPERVISÃO: 0

ASS. CONTRATO:

00/01/1900

O. SERV.: 00/01/1900

BASE PROPOSTA: Mar./2018

PRazo DE VIGÊNCIA: 31/12/2021

DECORRIDO: 44595

RESTANTE (VIGÊNCIA): -34

PRazo DE EXECUÇÃO: 30/06/2021

DECORRIDO: #####

RESTANTE (EXECUÇÃO): -218

ANOTAÇÕES:

1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)

DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS.

DESMONTE DE ROCHA.

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)

4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	REDOCLAGEM DE BASE	CEILO	T.S.D	IMPERMEABILIZAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	x		X													

CLIMA:

☒ X



SOL



NUBLADO



CHUVA



CHUVA

Pablo Fernandes Sampaio

Engenheiro Civil

CREA 50644/7293


	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 3
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						FL.: 2
						DATA:	03/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)						0	DIA DA SEMANA: quinta-feira
DADOS EXECUTORA							
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018				
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1316	RESTANTE (VIGÊNCIA): 114	PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1316	RESTANTE (EXECUÇÃO): -173	
DADOS SUPERVISORA							
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900				
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44595	RESTANTE (VIGÊNCIA): -34	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44595	RESTANTE (EXECUÇÃO): -218	
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'15", -49°40'2", 447.1m 03/02/2022 08:46:38		 -14°46'36", -49°39'28", 1925.8ft, 76° 2022-02-03 14:16:47		 -14°46'36", -49°39'28", 1996.1ft, 285° 2022-02-03 15:08:49			
FOTO1 -	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS.	FOTO2 -	EQUIPE DE DETONAÇÃO	FOTO3 -	CARREGAMENTO P/ DESMONTE DE ROCHA		
 -14°46'36", -49°39'27", 1954.7ft, 13° 2022-02-03 14:09:05		 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'37", -49°39'28", 690.ft 03/02/2022 17:40:47		 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'35", -49°39'23", 603.3ft 03/02/2022 17:49:00			
FOTO4 -	CARREGAMENTO P/ DESMONTE DE ROCHA	FOTO5 -	DESMONTE DE ROCHA	FOTO6 -	DESMONTE DE ROCHA		
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5067417293							

 Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes	DIÁRIO DE OBRAS								N.º4 FL.:1							
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)								DATA:04/02/2022							
TRECHO:GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)										DIA DA SEMANA:sexta-feira						
DADOS EXECUTORA																
EDITAL:033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO:044/2018		ASS. CONTRATO:28/06/2018		O. SERV.:28/06/2018										
BASE PROPOSTA:Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA:28/05/2022		DECORRIDO:1317		RESTANTE (VIGÊNCIA):113		PRAZO DE EXECUÇÃO:14/08/2021		DECORRIDO:1317	RESTANTE (EXECUÇÃO):-174					
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL:0		CONTRATO SUPERVISÃO:0		ASS. CONTRATO:00/01/1900		O. SERV.:00/01/1900										
BASE PROPOSTA:Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA:31/12/2021		DECORRIDO:44596		RESTANTE (VIGÊNCIA):-35		PRAZO DE EXECUÇÃO:30/06/2021		DECORRIDO:44596	RESTANTE (EXECUÇÃO):-219					
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECARGA DE BASE	GRUPO	T.S.D	IMPERMEABILIZAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X															
CLIMA: X   NUBLADO  CHUVA Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 506447293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 4
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 04/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: sexta-feira
DADOS EXECUTORA EDITAL: 033/2017 CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018 ASS. CONTRATO: 28/06/2018 O. SERV.: 28/06/2018			
BASE PROPOSTA: Abr./2017 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1317 REstante (VIGÊNCIA): 113 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1317 REstante (EXECUÇÃO): -174	
DADOS SUPERVISORA EDITAL: 0 CONTRATO SUPERVISÃO: 0 ASS. CONTRATO: 00/01/1900 O. SERV.: 00/01/1900			
BASE PROPOSTA: Mar./2018 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44596 REstante (VIGÊNCIA): -35 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44596 REstante (EXECUÇÃO): -129	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 2 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	
			
FOTO 4 - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	FOTO 5 - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	FOTO 6 - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 56614/7293			


	DIÁRIO DE OBRAS							N.º 5								
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)							FL.: 1								
							DATA: 05/02/2022									
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)																
DIA DA SEMANA: sábado																
DADOS EXECUTORA																
EDITAL: 033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018										
BASE PROPOSTA: Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1318		RESTANTE (VIGÊNCIA): 112		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021								
						DECORRIDO: 1318		RESTANTE (EXECUÇÃO): -175								
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900										
BASE PROPOSTA: Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44597		RESTANTE (VIGÊNCIA): -36		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021								
						DECORRIDO: 44597		RESTANTE (EXECUÇÃO): -220								
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
DESCANSO SEMANAL.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECOLAGEM DE BASE	GRUPO	T.S.D	IMPERMEABILIZAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
CLIMA:  SOL  NUBLADO X  CHUVA Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 5 FL.: 2
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		DATA: 05/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)			0 DIA DA SEMANA: sábado
DADOS EXECUTORA EDITAL: 033/2017 CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018 ASS. CONTRATO: 28/06/2018 O. SERV.: 28/06/2018 BASE PROPOSTA: Abr./2017 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022 DECORRIDO: 1318 RESTANTE (VIGÊNCIA): 112 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1318 RESTANTE (EXECUÇÃO): -175			
DADOS SUPERVISORA EDITAL: 0 CONTRATO SUPERVISÃO: 0 ASS. CONTRATO: 00/01/1900 O. SERV.: 00/01/1900 BASE PROPOSTA: Mar./2018 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021 DECORRIDO: 44597 RESTANTE (VIGÊNCIA): -36 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44597 RESTANTE (EXECUÇÃO): -220			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1 -	FOTO 2 -	FOTO 3 -	
FOTO 4 -	FOTO 5 -	FOTO 6 -	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293			



	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 6
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: domingo
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1319	RESTANTE (VIGÊNCIA): 111
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1319
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -176	
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44598	RESTANTE (VIGÊNCIA): -37
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44598
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -221	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1 -		FOTO 2 -	
FOTO 4 -		FOTO 5 -	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50674/7293			

	DIÁRIO DE OBRAS							N.º 7								
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)							FL.: 1								
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)							DATA: 07/02/2022									
DADOS EXECUTORA							DIA DA SEMANA: segunda-feira									
EDITAL: 033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018										
BASE PROPOSTA: Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1320		RESTANTE (VIGÊNCIA): 110										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021		DECORRIDO: 1320										
						RESTANTE (EXECUÇÃO): -177										
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900										
BASE PROPOSTA: Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44599		RESTANTE (VIGÊNCIA): -38										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021		DECORRIDO: 44599										
						RESTANTE (EXECUÇÃO): -222										
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS / PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECARGA DE BASE	ORLO	T.S.D	IMPERMEABILIZAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X															
CLIMA: SOL X NUBLADO CHUVA Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 15067417293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 7
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: segunda-feira
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1320	RESTANTE (VIGÊNCIA): 110 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1320 RESTANTE (EXECUÇÃO): -177
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44599	RESTANTE (VIGÊNCIA): -38 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44599 RESTANTE (EXECUÇÃO): -222
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 2 - FRAGMENTAÇÃO DE PEDRA	FOTO 3 - TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	
			
FOTO 4 - TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	FOTO 5 -		FOTO 6 -
 Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50614/7293			

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 8
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
		DATA: 08/02/2022	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)		0 DIA DA SEMANA: terça-feira	
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1321	RESTANTE (VIGÊNCIA): 109
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1321
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -178	
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44600	RESTANTE (VIGÊNCIA): -39
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44600
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -223	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	
			
FOTO 4 - SARJETA TRAPEZOIDAL	FOTO 5 - DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO	FOTO 6 - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5861417293			



DIÁRIO DE OBRAS

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)

N.º 9

FL.: 1

DATA: 09/02/2022

TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)

DIA DA SEMANA: quarta-feira

DADOS EXECUTORA

EDITAL: 033/2017

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018

ASS. CONTRATO: 28/06/2018

O. SERV.: 28/06/2018

BASE PROPOSTA: Abr./2017

PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022

DECORRIDO: 1322

RESTANTE (VIGÊNCIA): 108

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021

DECORRIDO: 1322

RESTANTE (EXECUÇÃO): -179

DADOS SUPERVISORA

EDITAL: 0

CONTRATO SUPERVISÃO: 0

ASS. CONTRATO: 00/01/1900

O. SERV.: 00/01/1900

BASE PROPOSTA: Mar./2018

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021

DECORRIDO: 44601

RESTANTE (VIGÊNCIA): -40

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021

DECORRIDO: 44601

RESTANTE (EXECUÇÃO): -224

ANOTAÇÕES:

1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)

4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REPAROS SUPERFICIAIS/PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECLOASEM DE BASE	CEIJO	TSD	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		X													

CLIMA:

☐ SOL

☒ NUBLADO

☐ CHUVA

Pablo Fernandes Sampaio

Engenheiro Civil

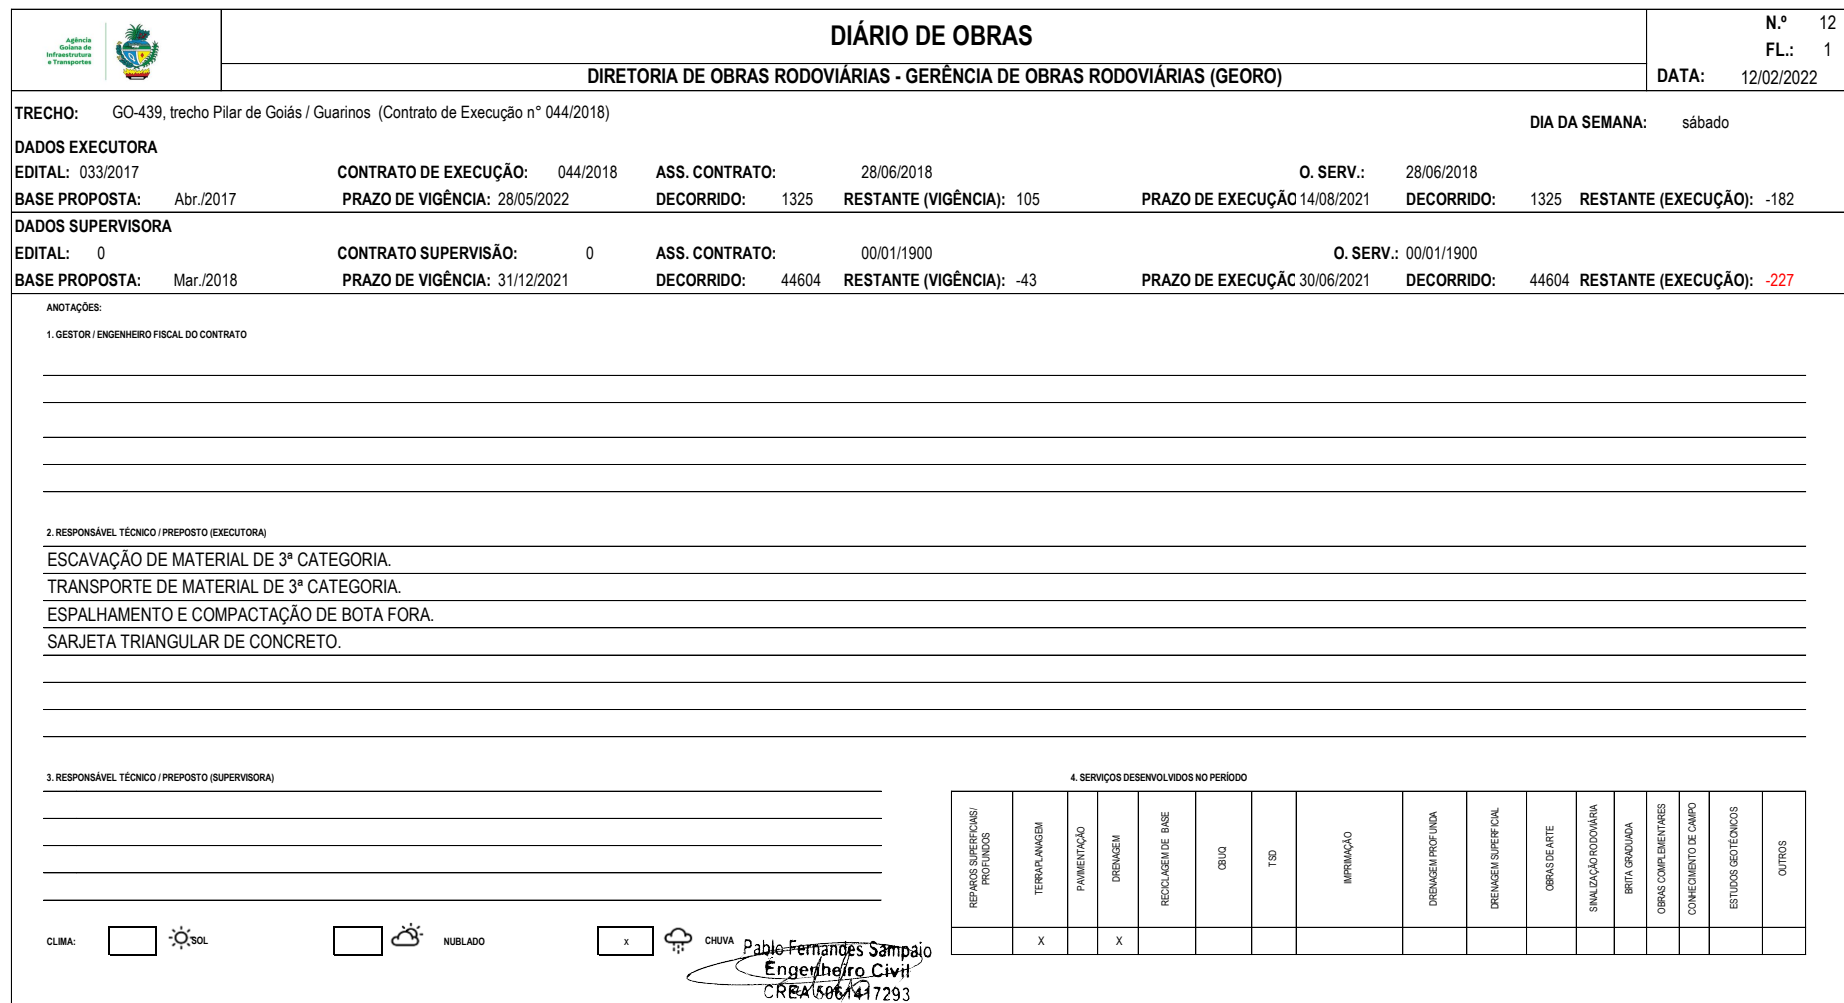
CREA 506147293

Agência Goiás de Infraestrutura e Transportes	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 9 FL.: 2	
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						DATA: 09/02/2022	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)							0	DIA DA SEMANA: quarta-feira
DADOS EXECUTORA								
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018					
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1322	RESTANTE (VIGÊNCIA): 108	PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1322	RESTANTE (EXECUÇÃO): -179		
DADOS SUPERVISORA								
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900					
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44601	RESTANTE (VIGÊNCIA): -40	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44601	RESTANTE (EXECUÇÃO): -224		
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
FOTO1 -	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO2 -	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO3 -	TRANSPORTE DE BRITA			
FOTO4 -	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	FOTO5 -	PERFURAÇÃO DE ROCHA	FOTO6 -	ENTRADA D'ÁGUA			
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293								

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 10
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: quinta-feira
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1323	RESTANTE (VIGÊNCIA): 107
PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021		DECORRIDO: 1323	RESTANTE (EXECUÇÃO): -180
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44602	RESTANTE (VIGÊNCIA): -41
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021		DECORRIDO: 44602	RESTANTE (EXECUÇÃO): -225
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 -14°46'19", -49°40'0", 1595,1ft, 318° 2022-02-10 08:01:01	 -14°46'19", -49°40'0", 1561,7ft, 195° 2022-02-10 08:13:47	 GO-439, Guarinos - GO, 76385-000, Brasil 216° 2022-02-10 08:25:02	
FOTO 1 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 2 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	
 -14°46'19", -49°40'0", 1566,4ft, 286° 2022-02-10 08:31:44	 -14°46'19", -49°40'0", 1575,8ft, 186° 2022-02-10 08:32:07		
FOTO 4 - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	FOTO 5 - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	FOTO 6 -	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5064417293			

 Agência Gestão de Infraestrutura e Transportes 	DIÁRIO DE OBRAS DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)										N.º11 FL.:1					
											DATA:11/02/2022					
TRECHO:GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)																
DIA DA SEMANA:sexta-feira																
DADOS EXECUTORA																
EDITAL:033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO:044/2018		ASS. CONTRATO:28/06/2018		O. SERV.:28/06/2018										
BASE PROPOSTA:Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA:28/05/2022		DECORRIDO:1324		RESTANTE (VIGÊNCIA):106		PRAZO DE EXECUÇÃO:14/08/2021		DECORRIDO:1324 RESTANTE (EXECUÇÃO):-181						
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL:0		CONTRATO SUPERVISÃO:0		ASS. CONTRATO:00/01/1900		O. SERV.:00/01/1900										
BASE PROPOSTA:Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA:31/12/2021		DECORRIDO:44603		RESTANTE (VIGÊNCIA):-42		PRAZO DE EXECUÇÃO:30/06/2021		DECORRIDO:44603 RESTANTE (EXECUÇÃO):-226						
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
FRAGMENTAÇÃO DE PEDRA.																
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECULAGEM DE BASE	GELO	T.S.D	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRAVILHA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		X													
CLIMA:  SOL X  NUBLADO  CHUVA Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 566147293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 11
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 11/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: sexta-feira
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017 BASE PROPOSTA: Abr./2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	ASS. CONTRATO: 28/06/2018 DECORRIDO: 1324	O. SERV.: 28/06/2018 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1324 RESTANTE (EXECUÇÃO): -181
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0 BASE PROPOSTA: Mar./2018	CONTRATO SUPERVISÃO: 0 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	ASS. CONTRATO: 00/01/1900 DECORRIDO: 44603	O. SERV.: 00/01/1900 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44603 RESTANTE (EXECUÇÃO): -226
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 2 - FRAGMENTAÇÃO DE PEDRA	FOTO 3 - TRANSPORTE DE MAT.3ªCATEGORIA	
			
FOTO 4 - ESCAVAÇÃO P/ SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	FOTO 5 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	FOTO 6 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50674/7293			




	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 12
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 12/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: sábado
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1325	RESTANTE (VIGÊNCIA): 105
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1325
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -182	
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44604	RESTANTE (VIGÊNCIA): -43
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44604
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -227	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA e TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 2 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 3 - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA	
			
FOTO 4 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	FOTO 5 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	FOTO 6 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50614/17293			

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 13
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 13/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: domingo
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1326	RESTANTE (VIGÊNCIA): 104 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1326 RESTANTE (EXECUÇÃO): -183
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44605	RESTANTE (VIGÊNCIA): -44 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44605 RESTANTE (EXECUÇÃO): -228
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1 -	FOTO 2 -	FOTO 3 -	
FOTO 4 -	FOTO 5 -	FOTO 6 -	



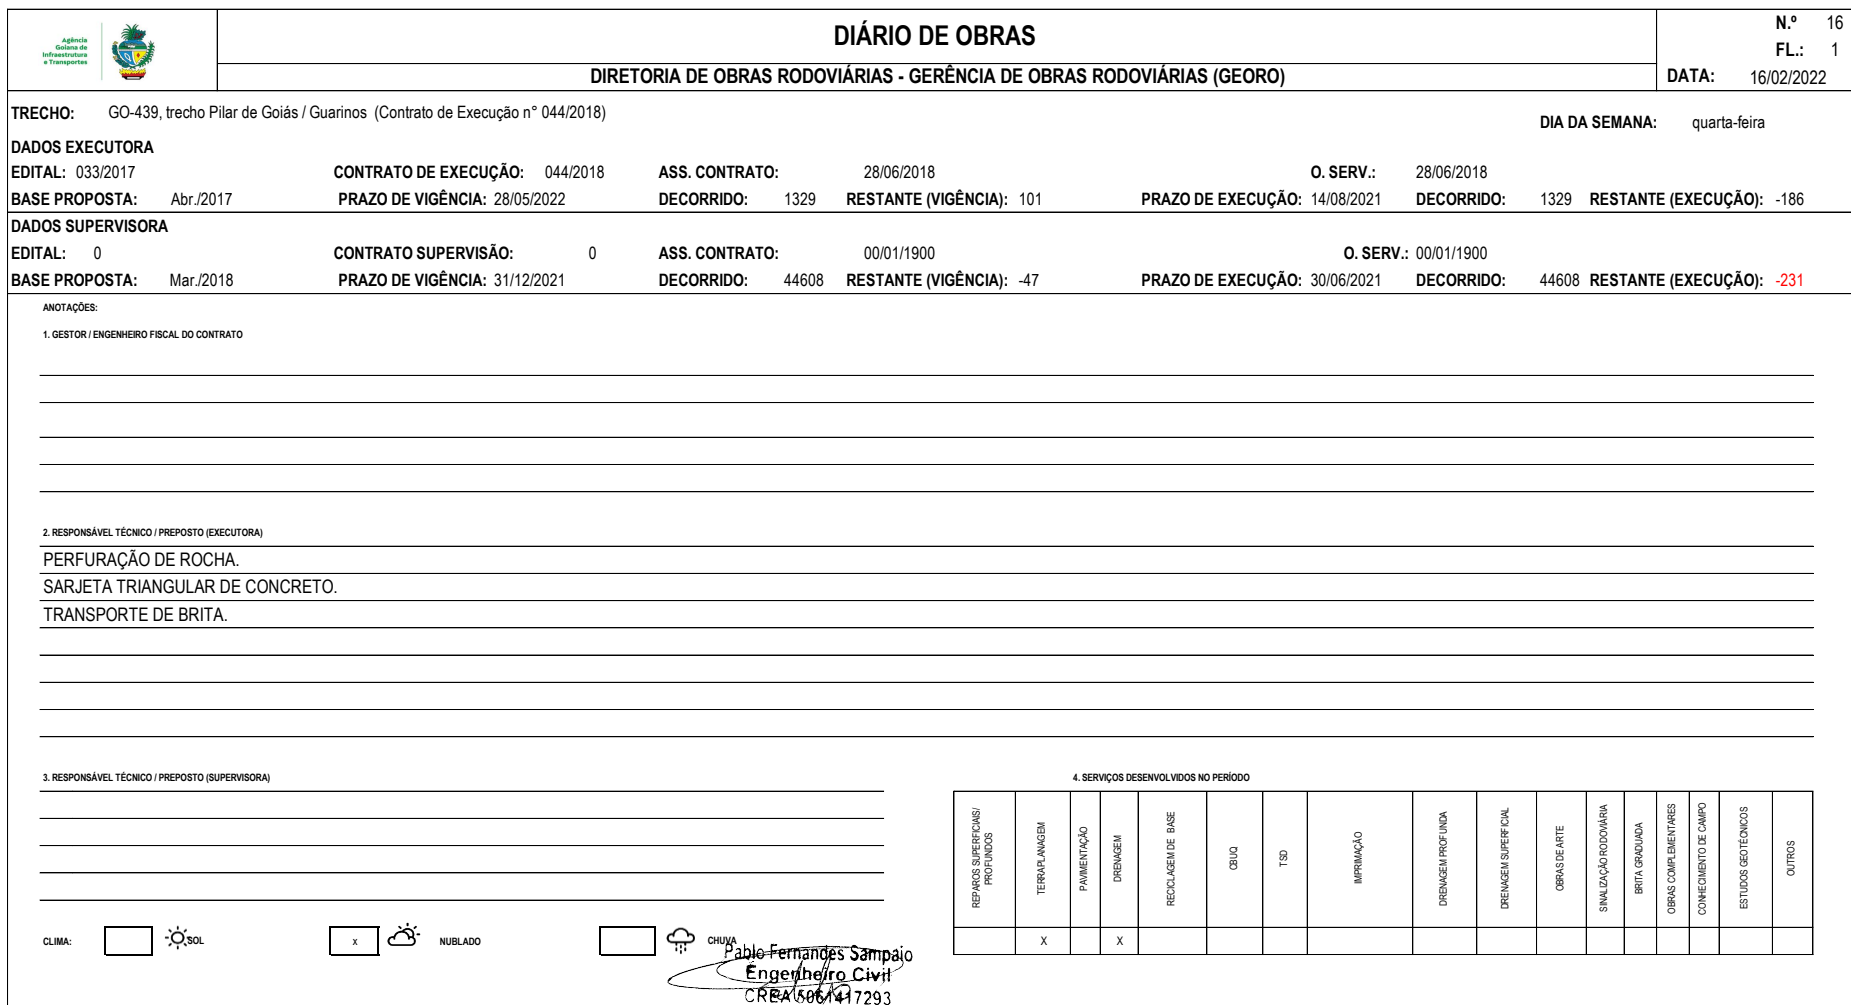
Pablo Fernandes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA 56614/7293

 Agência Goiás de Infraestrutura e Transportes	DIÁRIO DE OBRAS							N.º 14		
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)							FL.: 1		
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)							DATA: 14/02/2022		DIA DA SEMANA: segunda-feira	
DADOS EXECUTORA										
EDITAL: 033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018				
BASE PROPOSTA: Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1327		RESTANTE (VIGÊNCIA): 103		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1327 RESTANTE (EXECUÇÃO): -184		
DADOS SUPERVISORA										
EDITAL: 0		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900				
BASE PROPOSTA: Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44606		RESTANTE (VIGÊNCIA): -45		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44606 RESTANTE (EXECUÇÃO): -229		
ANOTAÇÕES:										
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO										
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)										
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.										
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.										
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)										
CLIMA: SOL NUBLADO X CHUVA										
REPAROS SUPERFICIAIS/PROFUNDOS TERRAPLANAGEM PAIMENTAÇÃO DRENAGEM REGULAGEM DE BASE CEILO T.S.D IMPERMEABILIZAÇÃO DRENAGEM PROFUNDA DRENAGEM SUPERFICIAL OBRAS DE ARTE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA BRITA GRADUADA OBRAS COMPLEMENTARES CONHECIMENTO DE CAMPO ESTUDOS GEOTÉCNICOS OUTROS X Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 6061417293										

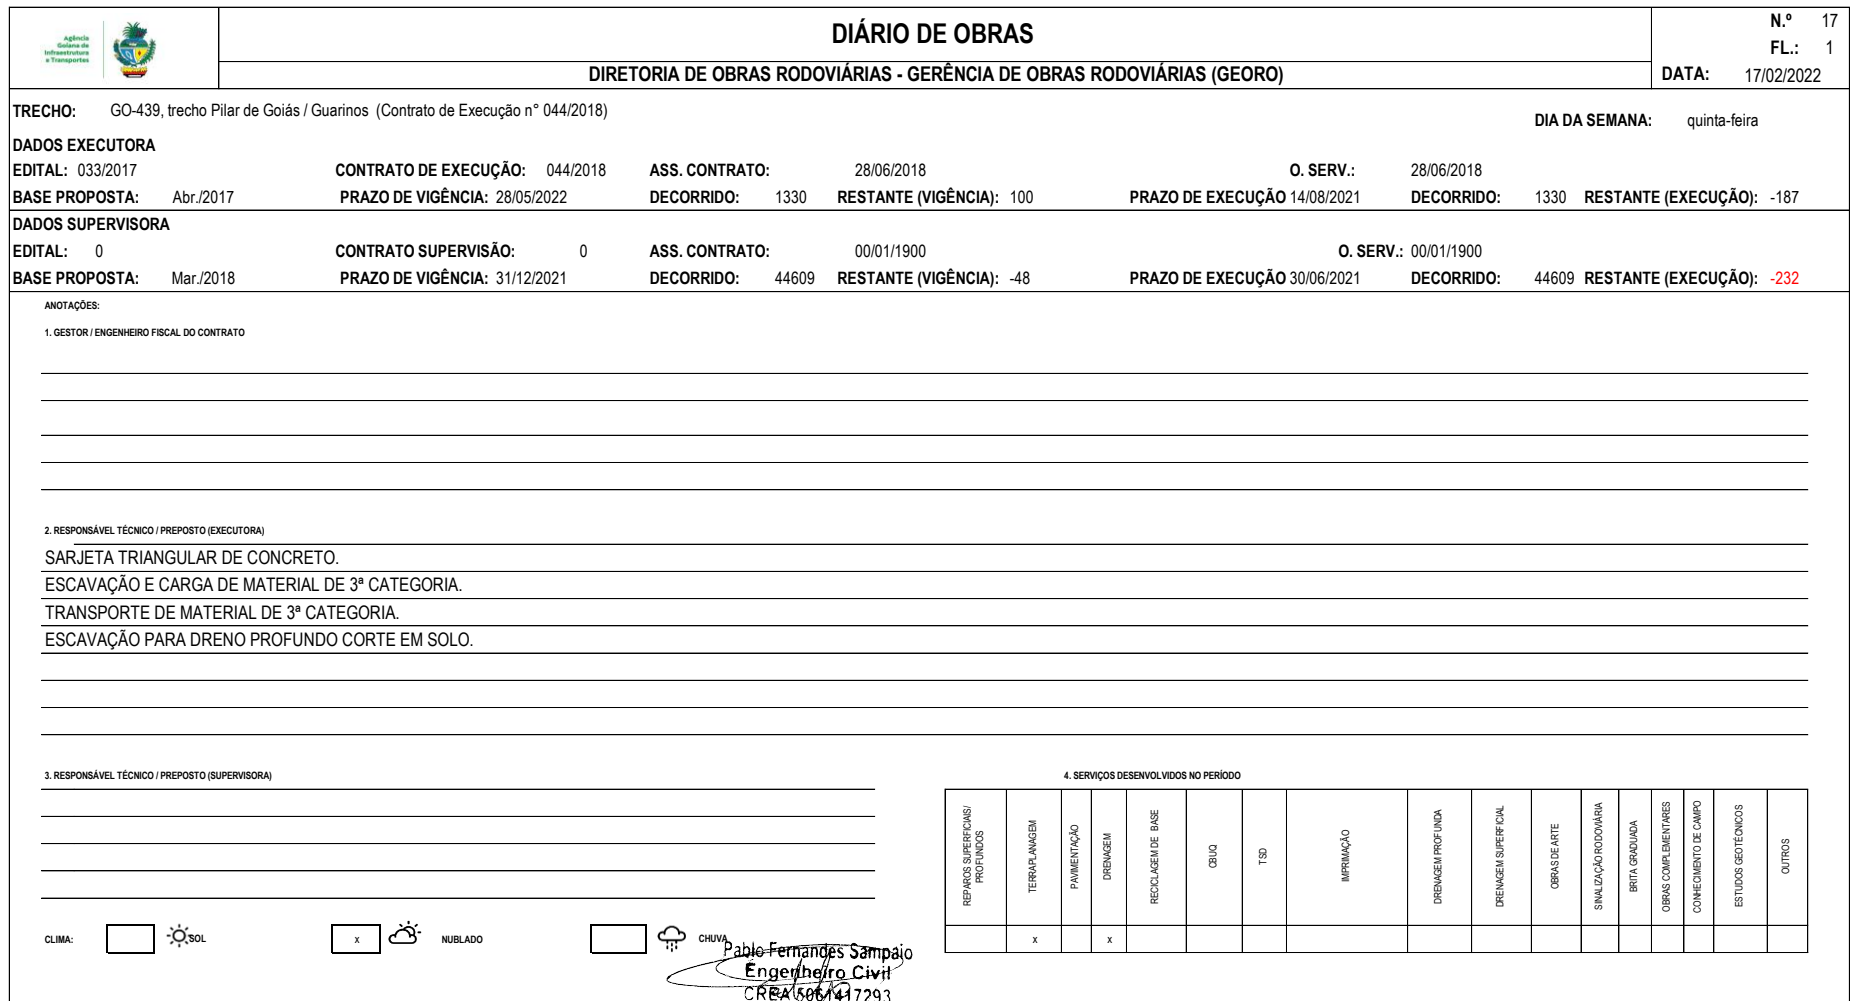
	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 14
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 14/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)			
		0	DIA DA SEMANA: segunda-feira
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1327	RESTANTE (VIGÊNCIA): 103 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1327 RESTANTE (EXECUÇÃO): -184
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44606	RESTANTE (VIGÊNCIA): -45 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44606 RESTANTE (EXECUÇÃO): -229
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA e TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	FOTO 2 - TRANSPORTE DE MAT. 3ª CATEGORIA	FOTO 3 - TRANSPORTE DE MAT. 3ª CATEGORIA	
			
FOTO 4 - TRANSPORTE DE MAT. 3ª CATEGORIA	FOTO 5 -	FOTO 6 -	
 Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50614/17293			

	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 15									
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						FL.: 1									
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)						DATA: 15/02/2022										
DADOS EXECUTORA						DIA DA SEMANA: terça-feira										
EDITAL: 033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018										
BASE PROPOSTA: Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1328		RESTANTE (VIGÊNCIA): 102										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021		DECORRIDO: 1328										
						RESTANTE (EXECUÇÃO): -185										
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900										
BASE PROPOSTA: Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44607		RESTANTE (VIGÊNCIA): -46										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021		DECORRIDO: 44607										
						RESTANTE (EXECUÇÃO): -230										
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
PERFURAÇÃO DE ROCHA.																
ACESSO PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO.																
ESTABILIZAÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM PEDRA DETONADA.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS / PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECULAGEM DE BASE	CEILQ	T.S.D	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		X													
CLIMA: SOL X NUBLADO Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 15
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 15/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: terça-feira
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1328	RESTANTE (VIGÊNCIA): 102 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1328 RESTANTE (EXECUÇÃO): -185
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44607	RESTANTE (VIGÊNCIA): -46 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44607 RESTANTE (EXECUÇÃO): -230
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - PERFURAÇÃO DE ROCHA	FOTO 2 - REGULARIZAÇÃO DE ACESSO PARA SARJETA	FOTO 3 - REGULARIZAÇÃO DE ACESSO PARA SARJETA	
			
FOTO 4 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE 15/02/22	FOTO 5 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE 15/02/22	FOTO 6 -	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 56644/7293			



Agência Goiás de Infraestrutura e Transportes	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 16 FL.: 2
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		DATA: 16/02/2022
TRUCHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018) 0 DIA DA SEMANA: quarta-feira			
DADOS EXECUTORA EDITAL: 033/2017 CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018 ASS. CONTRATO: 28/06/2018 O. SERV.: 28/06/2018 BASE PROPOSTA: Abr./2017 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022 DECORRIDO: 1329 RESTANTE (VIGÊNCIA): 101 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1329 RESTANTE (EXECUÇÃO): -186			
DADOS SUPERVISORA EDITAL: 0 CONTRATO SUPERVISÃO: 0 ASS. CONTRATO: 00/01/1900 O. SERV.: 00/01/1900 BASE PROPOSTA: Mar./2018 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021 DECORRIDO: 44608 RESTANTE (VIGÊNCIA): -47 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44608 RESTANTE (EXECUÇÃO): -231			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'37", -49°39'28", 599,4m 16/02/2022 10:41:32	 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'37", -49°39'29", 610,1m 16/02/2022 15:30:06	 -14°46'29", -49°39'21", 595,0m, 199" 16/02/2022 16:29:09	
FOTO 1 - PERFURAÇÃO DE ROCHA	FOTO 2 - PERFURAÇÃO DE ROCHA	FOTO 3 - TRANSPORTE DE BRITA	
 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'31", -49°39'47", 523,4m 16/02/2022 07:53:09	 -14°46'30", -49°39'47", 1710,1ft, 31" 2022-02-16 16:39:08	 -14°46'30", -49°39'47", 1689,0ft, 10" 2022-02-16 16:38:59	
FOTO 4 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	FOTO 5 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	FOTO 6 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 566147293			




	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 17
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
		DATA: 17/02/2022	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)			
		0 DIA DA SEMANA: quinta-feira	
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1330	RESTANTE (VIGÊNCIA): 100 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1330 RESTANTE (EXECUÇÃO): -187
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44609	RESTANTE (VIGÊNCIA): -48 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44609 RESTANTE (EXECUÇÃO): -232
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'29", -49°39'49", 502,0m 17/02/2022 09:22:01	 -14°46'36", -49°39'27", 1928,3ft, 260° 2022-02-17 07:33:43	 -14°46'29", -49°39'20", 1940,7ft, 57° 2022-02-17 15:40:59	
FOTO 1- SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	FOTO 2- DESMONTE DE ROCHA	FOTO 3- DRENO PROFUNDO	
 -14°46'18", -49°40'1", 1607,1ft, 196° 2022-02-17 14:04:46	 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'36", -49°39'30", 578,1m 17/02/2022 14:59:53	 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'36", -49°39'30", 595,0m 17/02/2022 15:00:23	
FOTO 4- TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50664/7293			


Agência Goiás de Infraestrutura e Transportes		DIÁRIO DE OBRAS						N.º18 FL.:1								
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)								DATA:18/02/2022								
TRECHO:GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)								DIA DA SEMANA:sexta-feira								
DADOS EXECUTORA		CONTRATO DE EXECUÇÃO:044/2018		ASS. CONTRATO:28/06/2018		O. SERV.:28/06/2018										
EDITAL:033/2017		PRAZO DE VIGÊNCIA:28/05/2022		DECORRIDO:1331		RESTANTE (VIGÊNCIA):99		PRAZO DE EXECUÇÃO:14/08/2021								
BASE PROPOSTA:Abr./2017								DECORRIDO:1331								
								RESTANTE (EXECUÇÃO):-188								
DADOS SUPERVISORA		CONTRATO SUPERVISÃO:0		ASS. CONTRATO:00/01/1900		O. SERV.:00/01/1900										
EDITAL:0		PRAZO DE VIGÊNCIA:31/12/2021		DECORRIDO:44610		RESTANTE (VIGÊNCIA):-49		PRAZO DE EXECUÇÃO:30/06/2021								
BASE PROPOSTA:Mar./2018								DECORRIDO:44610								
								RESTANTE (EXECUÇÃO):-233								
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA.																
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO.																
ESTABILIZAÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM PEDRA DETONADA.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECLOASE DE BASE	ORLO	TSD	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		x													
CLIMA: SOL NUBLADO X CHUVA Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5067447293																

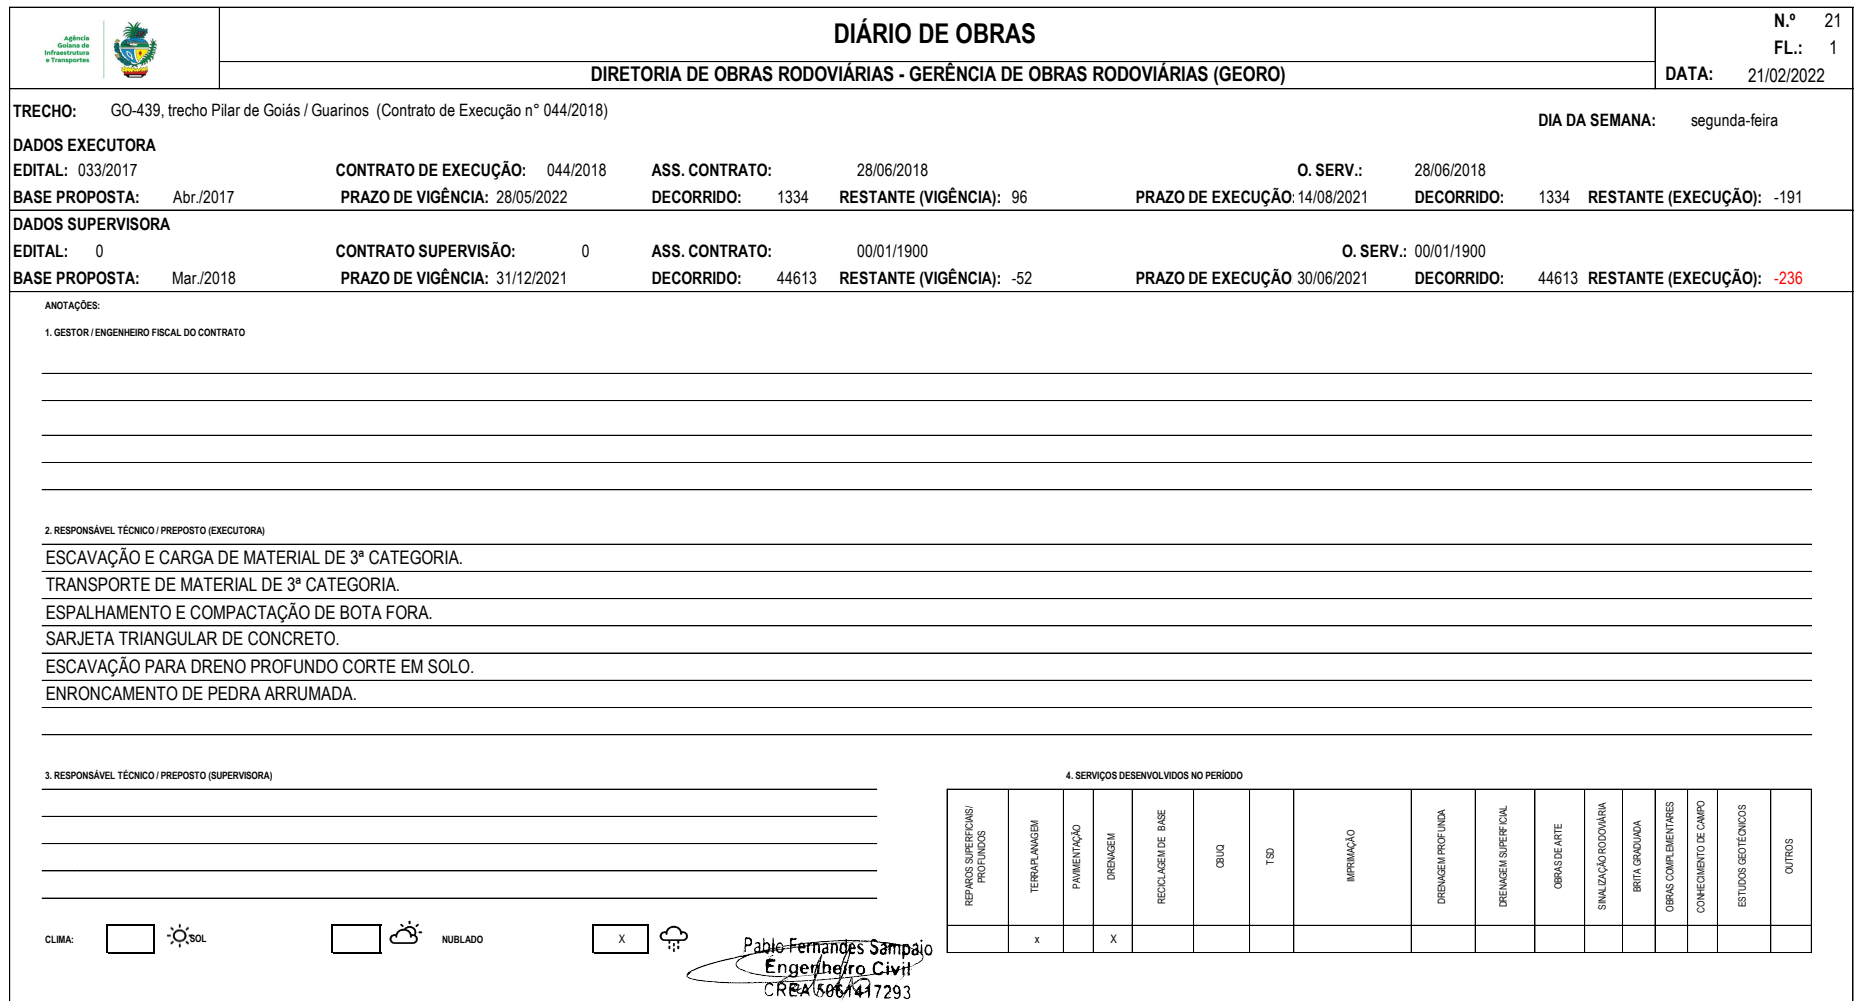
	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 18
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 18/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: sexta-feira
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1331	REstante (VIGÊNCIA): 99
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1331
		REstante (EXECUÇÃO): -188	
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44610	REstante (VIGÊNCIA): -49
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44610
		REstante (EXECUÇÃO): -233	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 -14°46'36", -49°39'30", 1881,6ft, 169" 2022-02-18 07:25:33	 -14°46'36", -49°39'31", 1824,6ft, 120" 2022-02-18 13:50:42	 -14°46'31", -49°39'20", 1972,0ft, 267"	
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.	FOTO 2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.	FOTO 3 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE 18/02/22	
	 GO-439 Pilar a Guarinos 14°46'9", -49°40'9", 447,9m 18/02/2022 07:26:56	 GO-439 Pilar a Guarinos 14°46'25", -49°39'53", 503,5m 18/02/2022 10:20:00	
FOTO 4 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO DE BAIXA CAP. 18/02/22 14°46'31"/49°39'20"	FOTO 5 - PRODUÇÃO DE CONCRETO	FOTO 6 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293			

Agência Goiás de Infraestrutura e Transportes 	DIÁRIO DE OBRAS DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						N.º 19 FL.: 1 DATA: 19/02/2022									
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)								DIA DA SEMANA: sábado								
DADOS EXECUTORA		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018										
EDITAL: 033/2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1332		RESTANTE (VIGÊNCIA): 98		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021								
BASE PROPOSTA: Abr./2017						DECORRIDO: 1332		RESTANTE (EXECUÇÃO): -189								
DADOS SUPERVISORA		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900										
EDITAL: 0		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44611		RESTANTE (VIGÊNCIA): -50		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021								
BASE PROPOSTA: Mar./2018						DECORRIDO: 44611		RESTANTE (EXECUÇÃO): -234								
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA.																
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFÍCIES/PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAIMENTAÇÃO	DRENAGEM	REDOLESE DE BASE	CEILO	T.S.D	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		X													
CLIMA: SOL NUBLADO X CHUVA																
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5067447293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 19
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
		DATA: 19/02/2022	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: sábado
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1332	RESTANTE (VIGÊNCIA): 98
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1332
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -189	
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44611	RESTANTE (VIGÊNCIA): -50
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44611
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -234	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.		FOTO 2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.	
			
		FOTO 3 - TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.	
			
FOTO 4 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO		FOTO 5 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	
			
		FOTO 6 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	
Pabre Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 56644/7293			

	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 20									
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						FL.: 1									
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)						DATA: 20/02/2022										
DADOS EXECUTORA						DIA DA SEMANA: domingo										
EDITAL: 033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018										
BASE PROPOSTA: Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1333		RESTANTE (VIGÊNCIA): 97										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021		DECORRIDO: 1333										
						RESTANTE (EXECUÇÃO): -190										
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900										
BASE PROPOSTA: Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44612		RESTANTE (VIGÊNCIA): -51										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021		DECORRIDO: 44612										
						RESTANTE (EXECUÇÃO): -235										
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
DESCANSO SEMANAL.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECICLAGEM DE BASE	CEBUQ	TSD	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
CLIMA: ☐ SOL ☒ NUBLADO ☐ CHUVA																
 Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5067417293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 20
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
			DATA: 20/02/2022
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)			
		0	DIA DA SEMANA: domingo
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1333	RESTANTE (VIGÊNCIA): 97
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1333
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -190	
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44612	RESTANTE (VIGÊNCIA): -51
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44612
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -235	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1 -	FOTO 2 -	FOTO 3 -	
FOTO 4 -	FOTO 5 -	FOTO 6 -	
 Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 506/147293			



	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 21	
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)			0	DIA DA SEMANA: segunda-feira
DADOS EXECUTORA				
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018	
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1334	RESTANTE (VIGÊNCIA): 96	PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1334 RESTANTE (EXECUÇÃO): -191
DADOS SUPERVISORA				
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900	
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44613	RESTANTE (VIGÊNCIA): -52	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44613 RESTANTE (EXECUÇÃO): -236
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
 14°46'37", -49°39'27", 1999,7ft, 333" 2022-02-21 13:15:22		 14°46'31", -49°39'21", 1930,5ft, 52" 2022-02-21 09:41:21		 14°46'19", -49°39'59", 1535,9ft, 180" 2022-02-21 15:12:22
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.		FOTO 2 - DRENO PROFUNDO		FOTO 3 - ENRONCAMENTO
 14°46'23", -49°39'56", 1540,1ft, 344" 2022-02-21 15:20:01		 14°46'30", -49°39'46", 1723,0ft, 216" 2022-02-21 15:36:50		 14°46'26", -49°39'53", 1639,7ft, 10" 2022-02-21 08:01:04
FOTO 4 - ENRONCAMENTO		FOTO 5 - TRNASPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA		FOTO 6 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 506417293				

Agência Goiás de Infraestrutura e Transportes 	DIÁRIO DE OBRAS DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						N.º 22 FL.: 1 DATA: 22/02/2022									
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)							DIA DA SEMANA: terça-feira									
DADOS EXECUTORA																
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018													
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1335	RESTANTE (VIGÊNCIA): 95	PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1335	RESTANTE (EXECUÇÃO): -192										
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900													
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44614	RESTANTE (VIGÊNCIA): -53	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44614	RESTANTE (EXECUÇÃO): -237										
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
É NECESSÁRIO O INCREMENTO DAS EQUIPES VISANDO O TÉRMINO DAS OBRAS DENTRO DO PERÍODO CONTRATUAL																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
PERFURAÇÃO DE ROCHA																
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA MAT. 3ª CATEGORIA.																
ESCAVAÇÃO PARA DRENO PROFUNDO CORTE EM SOLO.																
DRENO PROFUNDO.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECARGA DE BASE	CELO	T.S.D	IMPLANTAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		X													
CLIMA: SOL NUBLADO X CHUVA																
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 22	
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)			DATA: 22/02/2022	
DADOS EXECUTORA			DIA DA SEMANA: terça-feira	
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018	
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1335	RESTANTE (VIGÊNCIA): 95	PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1335 RESTANTE (EXECUÇÃO): -192
DADOS SUPERVISORA				
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900	
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44614	RESTANTE (VIGÊNCIA): -53	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44614 RESTANTE (EXECUÇÃO): -237
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
 -14°46'37", -49°39'27", 1998,8ft, 336" 2022-02-22 09:12:19		 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'37", -49°39'28", 590,0m 22/02/2022 15:31:54		 GO-439 Pilar a Guarinos -14°46'27", -49°39'19", 588,6m 18/02/2022 14:11:24
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.		FOTO 2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.		FOTO 3 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 3ª CAT. EM VALA
 -14°46'31", -49°39'21", 1942,6ft, 47" 2022-02-21 09:42:43		 -14°46'29", -49°39'20", 1919,5ft, 237" 2022-02-22 13:25:47		 -14°46'28", -49°39'20", 1898,9ft, 234" 2022-02-22 13:25:18
FOTO 4 - DRENO PROFUNDO		FOTO 5 - DRENO PROFUNDO.		FOTO 6 - DRENO PROFUNDO.
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5861417293				

	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 23									
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						FL.: 1										
						DATA: 23/02/2022										
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)																
DIA DA SEMANA: quarta-feira																
DADOS EXECUTORA																
EDITAL: 033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018										
BASE PROPOSTA: Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1336		RESTANTE (VIGÊNCIA): 94										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021		DECORRIDO: 1336										
						RESTANTE (EXECUÇÃO): -193										
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900										
BASE PROPOSTA: Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44615		RESTANTE (VIGÊNCIA): -54										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021		DECORRIDO: 44615										
						RESTANTE (EXECUÇÃO): -238										
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.																
DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS.																
ESCAVAÇÃO PARA DRENO PROFUNDO CORTE EM SOLO.																
DRENO PROFUNDO.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECICLAGEM DE BASE	GRUPO	TSD	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		X													
CLIMA: SOL X NUBLADO CHUVA Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50674-1/2023																

	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 23
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						FL.: 2
						DATA: 23/02/2022	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)						0	DIA DA SEMANA: quarta-feira
DADOS EXECUTORA							
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018				
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1336	RESTANTE (VIGÊNCIA): 94	PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1336	RESTANTE (EXECUÇÃO): -193	
DADOS SUPERVISORA							
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900				
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44615	RESTANTE (VIGÊNCIA): -54	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44615	RESTANTE (EXECUÇÃO): -238	
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.		FOTO 2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.		FOTO 3 - TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.			
							
FOTO 4 - DRENO PROFUNDO		FOTO 5 - DRENO PROFUNDO		FOTO 6 - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS			
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50614/7293							



DIÁRIO DE OBRAS

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)

N.º 24

FL.: 1

DATA: 24/02/2022

TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)

DIA DA SEMANA: quinta-feira

DADOS EXECUTORA

EDITAL: 033/2017

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018

ASS. CONTRATO: 28/06/2018

O. SERV.: 28/06/2018

BASE PROPOSTA: Abr./2017

PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022

DECORRIDO: 1337

RESTANTE (VIGÊNCIA): 93

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021

DECORRIDO: 1337

RESTANTE (EXECUÇÃO): -194

DADOS SUPERVISORA

EDITAL: 0

CONTRATO SUPERVISÃO: 0

ASS. CONTRATO: 00/01/1900

O. SERV.: 00/01/1900

BASE PROPOSTA: Mar./2018

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021

DECORRIDO: 44616

RESTANTE (VIGÊNCIA): -55

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021

DECORRIDO: 44616

RESTANTE (EXECUÇÃO): -239

ANOTAÇÕES:

1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA FORA

DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS.

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)

4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REPAROS SUPERFICIAIS/PROFUNDOS	TERRAPILAGEM	PAIMENTAÇÃO	DRENAGEM	REDOLEGE DE BASE	CEIJO	TSD	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
	X		X													

CLIMA:

SOL

X

NUBLADO

CHUVA

Pablo Fernandes Sampaio

Engenheiro Civil

CREA 50614/7293


	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 24
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
		DATA: 24/02/2022	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0 DIA DA SEMANA: quinta-feira	
DADOS EXECUTORA EDITAL: 033/2017 CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018 ASS. CONTRATO: 28/06/2018 O. SERV.: 28/06/2018			
BASE PROPOSTA: Abr./2017 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022 DECORRIDO: 1337 RESTANTE (VIGÊNCIA): 93 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1337 RESTANTE (EXECUÇÃO): -194			
DADOS SUPERVISORA EDITAL: 0 CONTRATO SUPERVISÃO: 0 ASS. CONTRATO: 00/01/1900 O. SERV.: 00/01/1900			
BASE PROPOSTA: Mar./2018 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021 DECORRIDO: 44616 RESTANTE (VIGÊNCIA): -55 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44616 RESTANTE (EXECUÇÃO): -239			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO1 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT./ESP. COMPACTAÇÃO DE BF	FOTO2 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT.	FOTO3 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT.	
			
FOTO4 - PERFURAÇÃO DE ROCHA	FOTO5 - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	FOTO6 - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50664/7293			


--

Agência
Goiás de
Infraestrutura
e Transportes

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 25
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: sexta-feira
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1338	RESTANTE (VIGÊNCIA): 92
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1338
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -195	
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44617	RESTANTE (VIGÊNCIA): -56
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44617
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -240	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.	FOTO 2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.	FOTO 3 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT./ESPA LHAMENTO E COMPACT. DE BOTA FORA	
			
FOTO 4 - PERFURAÇÃO DE ROCHA	FOTO 5 - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	FOTO 6 - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293			

	DIÁRIO DE OBRAS				N.º 26 FL.: 2	
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)				DATA: 26/02/2022	
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n° 044/2018)				0		DIA DA SEMANA: sábado
DADOS EXECUTORA EDITAL: 033/2017 CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018 ASS. CONTRATO: 28/06/2018 O. SERV.: 28/06/2018 BASE PROPOSTA: Abr./2017 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022 DECORRIDO: 1339 RESTANTE (VIGÊNCIA): 91 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1339 RESTANTE (EXECUÇÃO): -196						
DADOS SUPERVISORA EDITAL: 0 CONTRATO SUPERVISÃO: 0 ASS. CONTRATO: 00/01/1900 O. SERV.: 00/01/1900 BASE PROPOSTA: Mar./2018 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021 DECORRIDO: 44618 RESTANTE (VIGÊNCIA): -57 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44618 RESTANTE (EXECUÇÃO): -241						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
FOTO 1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.		FOTO 2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.		FOTO 3 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT./ESPALHAMENTO E COMPACT. DE BOTA FORA		
						
FOTO 4 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT.		FOTO 5 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT./ESPALHAMENTO E COMPACT. DE BOTA FORA		FOTO 6 - ESPALHAMENTO E COMPACT. DE BOTA FORA		
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 56644/7293						

	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 27									
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						FL.: 1									
						DATA: 27/02/2022										
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)																
DIA DA SEMANA: domingo																
DADOS EXECUTORA																
EDITAL: 033/2017		CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018		ASS. CONTRATO: 28/06/2018		O. SERV.: 28/06/2018										
BASE PROPOSTA: Abr./2017		PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022		DECORRIDO: 1340		RESTANTE (VIGÊNCIA): 90										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021		DECORRIDO: 1340 RESTANTE (EXECUÇÃO): -197										
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0		CONTRATO SUPERVISÃO: 0		ASS. CONTRATO: 00/01/1900		O. SERV.: 00/01/1900										
BASE PROPOSTA: Mar./2018		PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021		DECORRIDO: 44619		RESTANTE (VIGÊNCIA): -58										
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021		DECORRIDO: 44619 RESTANTE (EXECUÇÃO): -242										
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
Descanso semanal.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	REDOLENTES DE BASE	CEILO	T.S.D	IMPRIMAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☒ CHUVA  Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293																

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 27
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)		FL.: 2
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)		0	DIA DA SEMANA: domingo
DADOS EXECUTORA			
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1340	RESTANTE (VIGÊNCIA): 90
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021	DECORRIDO: 1340
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -197	
DADOS SUPERVISORA			
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44619	RESTANTE (VIGÊNCIA): -58
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021	DECORRIDO: 44619
		RESTANTE (EXECUÇÃO): -242	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO 1 -	FOTO 2 -	FOTO 3 -	
FOTO 4 -	FOTO 5 -	FOTO 6 -	
 Paulo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 50614/17293			

	DIÁRIO DE OBRAS										N.º 28					
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)										FL.: 1					
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução nº 044/2018)										DATA: 28/02/2022						
DADOS EXECUTORA										DIA DA SEMANA: segunda-feira						
EDITAL: 033/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018	ASS. CONTRATO: 28/06/2018	O. SERV.: 28/06/2018													
BASE PROPOSTA: Abr./2017	PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022	DECORRIDO: 1341	RESTANTE (VIGÊNCIA): 89	PRAZO DE EXECUÇÃO 14/08/2021	DECORRIDO: 1341	RESTANTE (EXECUÇÃO): -198										
DADOS SUPERVISORA																
EDITAL: 0	CONTRATO SUPERVISÃO: 0	ASS. CONTRATO: 00/01/1900	O. SERV.: 00/01/1900													
BASE PROPOSTA: Mar./2018	PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021	DECORRIDO: 44620	RESTANTE (VIGÊNCIA): -59	PRAZO DE EXECUÇÃO 30/06/2021	DECORRIDO: 44620	RESTANTE (EXECUÇÃO): -243										
ANOTAÇÕES:																
1. GESTOR / ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO																
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (EXECUTORA)																
CONSTRUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO.																
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO / PREPOSTO (SUPERVISORA)																
4. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO																
REPAROS SUPERFICIAIS/ PROFUNDOS	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	RECULAGEM DE BASE	ORLO	T.S.D	IMPERMEABILIZAÇÃO	DRENAGEM PROFUNDA	DRENAGEM SUPERFICIAL	OBRAS DE ARTE	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	BRITA GRADUADA	OBRAS COMPLEMENTARES	CONHECIMENTO DE CAMPO	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	OUTROS
			*													
CLIMA: SOL X NUBLADO CHUVA											Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 15061417293					

	DIÁRIO DE OBRAS						N.º 28
	DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - GERÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS (GEORO)						FL.: 2
TRECHO: GO-439, trecho Pilar de Goiás / Guarinos (Contrato de Execução n.º 044/2018)						0	DIA DA SEMANA: segunda-feira
DADOS EXECUTORA EDITAL: 033/2017 CONTRATO DE EXECUÇÃO: 044/2018 ASS. CONTRATO: 28/06/2018 O. SERV.: 28/06/2018 BASE PROPOSTA: Abr./2017 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/05/2022 DECORRIDO: 1341 RESTANTE (VIGÊNCIA): 89 PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2021 DECORRIDO: 1341 RESTANTE (EXECUÇÃO): -198							
DADOS SUPERVISORA EDITAL: 0 CONTRATO SUPERVISÃO: 0 ASS. CONTRATO: 00/01/1900 O. SERV.: 00/01/1900 BASE PROPOSTA: Mar./2018 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021 DECORRIDO: 44620 RESTANTE (VIGÊNCIA): -59 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/06/2021 DECORRIDO: 44620 RESTANTE (EXECUÇÃO): -243							
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
						FOTO1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT. FOTO2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT. FOTO3 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 3ª CAT.	
						FOTO5 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT./ESPA LHAMENTO E COMPACT. DE BF FOTO5 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT./ESPA LHAMENTO E COMPACT. DE BOTA FORA FOTO6 - TRANSPORTE DE MAT. DE 3ª CAT./ESPA LHAMENTO E COMPACT. DE BOTA FORA	
Pablo Fernandes Sampaio Engenheiro Civil CREA 5061417293							

OBRA: GO 439 - PILAR DE GOIÁS A GUARINOS

MAPA DE CHUVA

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS		1	2	3	4	5	6
MANHÃ		B	B	B	B	B	B
TARDE		B	B	B	B	C	B
NOITE		B	B	B	B	C	B
	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	7	8	9	10	11	12	13
MANHÃ	B	C	B	C	B	B	B
TARDE	B	B	B	B	B	B	B
NOITE	C	B	C	B	B	B	B
	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	14	15	16	17	18	19	20
MANHÃ	C	B	B	C	C	C	B
TARDE	C	B	B	B	B	C	C
NOITE	B	B	C	B	C	B	C
	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	21	22	23	24	25	26	27
MANHÃ	B	C	B	B	B	B	B
TARDE	B	B	C	B	B	B	B
NOITE	B	B	C	B	B	B	B
	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	28						
MANHÃ	B						
TARDE	B						
NOITE	B						
LEGENDA				TOTAL		% MÊS	
B	BOM			65		77,38%	
C	CHUVA			19		22,62%	
I	IMPRATICÁVEL			0		0,00%	
